

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,7
			TOTAL: R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 14.713,74						R$ 0,00	R$ 14.713,18	R$ 14.713,1
1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO						519,34								
1.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	110,97	4,68	519,34		110,97	110,97	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 519,33	R$ 519,3
1.2	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA						1678,44								
1.2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	4,00	419,61	1678,44		4,00	4,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.678,44	R$ 1.678,4
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA						1102,14								
1.3.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	150,36	7,33	1102.14		150,36	150,36	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.102,14	R$ 1.102,1
1.4	DEMILIÇÃO E RETIRADA						11413,82								
1.4.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	32,03	63,61	2.037,74		32,03	32,03	0,01	100,0%	R$ 0,00	R$ 2.037,17	R$ 2.037,1
1.4.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	8,03	275,68	2.213,71		8,03	8,03	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 2.213,71	R$ 2.213,7
1.4.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	10,38	16,97	176,15		10,38	10,38	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 176,15	R$ 176,1
1.4.4	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	170,94	9,35	1.598,29		170,94	170,94	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.598,29	R$ 1.598,2
1.4.5	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	48,93	15,91	778,48		48,93	48,93	0,00	100,0%	R$ 0,00	R$ 778,48	R$ 778,4
1.4.6	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	8,70	8,73	75,95		8,70	8,70	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 75,95	R$ 75,9
1.4.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	48,93	14,84	726.12		48,93	48,93	0,00	100,0%	R$ 0,00	R$ 726,12	R$ 726,1
1.4.8	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	5,00	87,39	436.95		5,00	5,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 436,95	R$ 436,9
1.4.9	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS	SEINFRA	M2	59,25	53,02	3.141,44		59,25	59,25	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 3.141,44	R$ 3.141,4
1.4.10	C2211	RETIRADA DE VIDROS COM REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	4,96	46,17	229,00		4,96	4,96	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 229,00	R$ 229,0

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,7
			TOTAL: R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
2	**MOVIMENTO DE TERRA**						**R$ 23.252,13**						**R$ 0,00**	**R$ 7.764,17**	**R$ 7.764,1**
2.1	**ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO**						**6413,09**								
2.1.1	C2921	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	201,73	31,79	6.413,09		14,25	14,25	187,48	7,1%	R$ 0,00	R$ 453,06	R$ 453,0
2.2	**CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL**						**11924,67**								
2.2.1	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	307,65	4,10	1.261,38		62,63	62,63	245,02	20,36%	R$ 0,00	R$ 256,80	R$ 256,8
2.2.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	307,65	34,66	10.663,29		62,63	62,63	245,02	20,36%	R$ 0,00	R$ 2.170,91	R$ 2.170,9
2.3	**ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES**						**4914,37**								
2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	SEINFRA	M3	99,12	49,58	4.914,37		98,50	98,50	0,62	99,37%	R$ 0,00	R$ 4.883,40	R$ 4.883,4
3	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**						**R$ 105.994,58**						**R$ 0,00**	**R$ 105.993,84**	**R$ 105.993,8**
3.1	**EMBASAMENTOS E BALDRAMES**						**29787,72**								
3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	40,46	736,27	29.787,72		40,46	40,46	0,00	100,0%	R$ 0,00	R$ 29.787,72	R$ 29.787,7
3.2	**FORMAS**						**13675,10**								
3.2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PARA FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	39,14	79,63	3.116,72		39,14	39,14	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 3.116,72	R$ 3.116,7
3.2.2	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PARA SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	65,58	161,00	10.558,38		65,58	65,58	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 10.558,38	R$ 10.558,3

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,73
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,73
			TOTAL: R$ 556.224,46
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,67
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,79
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,46
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,00

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
3.3	**ARMADURAS**						**24624,31**								
3.3.1	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12.5 A 25,0MM	SEINFRA	KG	210.69	18,02	3.796,63		210,69	210,69	0,00	**100,00%**	R$ 0,00	R$ 3.796,59	R$ 3.796,59
3.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	887.53	17,00	15.088,01		887,53	887,53	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 15.088,01	R$ 15.088,01
3.3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3.40 A 6,40MM	SEINFRA	KG	386.51	14,85	5.739,66		386,51	386,51	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 5.739,66	R$ 5.739,66
3.4	**CONCRETOS**						**28871,18**								
3.4.1	C0843	CONCRETO PARA VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,48	512,98	4.352,31		8,48	8,48	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 4.352,33	R$ 4.352,33
3.4.2	C0846	CONCRETO PARA VIBR., FCK 40 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	26.19	609,04	15.950,76		26,19	26,19	0,00	**100,00%**	R$ 0,00	R$ 15.950,76	R$ 15.950,76
3.4.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SEM ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	8,48	162,22	1.376,34		8,48	8,48	0,00	100%	R$ 0,00	R$ 1.375,63	R$ 1.375,63
3.4.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO COM ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	26,19	274,60	7.191,77		26,19	26,19	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 7.191,77	R$ 7.191,77
3.5	**ELEMENTOS DE CONCRETO PÉ-FABRICADO**						**9036,27**								
3.5.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA FÔRRO - VÃO ATÉ 2.80 M	SEINFRA	M2	61,67	141,27	8.712,12		61,67	61,67	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 8.712,12	R$ 8.712,12
3.5.2	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA FÔRRO - VÃO ATÉ 2 M	SEINFRA	M2	2.86	113,34	324.15		2,86	2,86	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 324,15	R$ 324,15
4	**PAREDES E PAINÉIS**						**R$ 36.846,64**						**R$ 0,00**	**R$ 36.846,14**	**R$ 36.846,14**

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,73
			ADITIVO: R$ 83.330,73
LOCAL: ALTO SANTO - CE			TOTAL: R$ 556.224,46
	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,67
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,79
	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,46
BDI: 22,76%			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,00

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
4.1	**ALVENARIA DE ELEVAÇÃO**						**36388,60**								
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	344,06	71,96	24.758,56		344,06	344,06	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 24.758,56	R$ 24.758,5
4.1.2	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	175,76	66,17	11.630,04		175,76	175,76	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 11.630,04	R$ 11.630,0
4.2	**ELEMENTOS VAZADOS**						**458,05**								
4.2.1	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)CM COM ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA		4,58	100,01	458,05		4,58	4,58	0,01	100%	R$ 0,00	R$ 457,55	R$ 457,5
5	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**						**R$ 34.321,12**						**R$ 512,00**	**R$ 28.395,11**	**R$ 28.907,1**
5.1	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**						**22797,83**								
5.1.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M	SEINFRA	UN	0,00	1.034,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,(
5.1.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)M	SEINFRA	UN	0,00	919,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,(
5.1.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	SEINFRA	UN	1,00	951,57	951,57		0,00	0,00	1,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,(
5.1.4	CP-0001	PORTA DE CORRER (0,80X2,10M), COMPLETA	SEINFRA	UN	0,00	1.053,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,
5.1.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	34,44	634,33	21.846,26		34,44	34,44	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 21.846,26	R$ 21.846,

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,73
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,73
			TOTAL: R$ 556.224,46
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,67
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,79
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,46
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,00

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
5.2	**ESQUADRIAS METÁLICAS**						**11523,29**								
5.2.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	0,00	222,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5.2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	14,68	595,35	8.739,74	0,86	11,00	11,86	2,82	80,79%	R$ 512,00	R$ 6.548,85	R$ 7.060,85
5.2.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	11,00	253,05	2.783,55		0,00	0,00	11,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5.3	**OUTROS ELEMENTOS**						**0,00**								
5.3.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,00	145,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6	**VIDROS**						**R$ 5.372,29**						**R$ 5.372,69**	**R$ 0,00**	**R$ 5.372,69**
6.1	**CRISTAIS TEMPERADO**						**5372.29**								
6.1.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)M E=10MM	SEINFRA	CJ	0,00	2.222,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6.1.2	C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m	SEINFRA	CJ	1,00	5.372,69	5.372,29	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 5.372,69	R$ 0,00	R$ 5.372,69
7	**COBERTURA**						**R$ 85.512,53**						**R$ 0,00**	**R$ 36.542,94**	**R$ 36.542,94**
7.1	**ESTRUTURA METÁLICA**						**67504,34**								

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,7
			TOTAL: R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
7.1.1	C1332	ESTRUTURA METÁLICANK VÃO DE 20M	SEINFRA	M2	351,86	191,85	67.504,34		150,36	150,36	201,50	42,73%	R$ 0,00	R$ 28.847,31	R$ 28.847,3
7.2	**TELHAS**						**18008,19**								
7.2.1	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM , INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	351,86	51,18	18.008,19		150,36	150,36	201,50	42,73%	R$ 0,00	R$ 7.695,62	R$ 7.695,6
8	**REVESTIMENTOS**						**R$ 49.506,91**						**R$ 3.253,19**	**R$ 43.179,65**	**R$ 46.432,8**
8.1	**ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**						**33639,65**								
8.1.1	C0776	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM PARA PAREDE	SEINFRA	M2	688,12	7,44	5.119,61	53,03	635,09	688,12	0,00	100,00%	R$ 394,51	R$ 4.725,10	R$ 5.119,6
8.1.2	C1220	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,30	38,49	896,97		23,30	23,30	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 896,97	R$ 896,9
8.1.3	C3408	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	664,82	41,55	27.623,06	1,82	663,00	664,82	0,00	100,00%	R$ 75,45	R$ 27.547,61	R$ 27.623,0
8.2	**ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**						**6249,65**								
8.2.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - PARA PAREDE	SEINFRA	M2	52,99	108,48	5.748,36	-14,80	41,44	26,64	26,35	50,27%	-R$ 1.605,50	R$ 4.495,41	R$ 2.889,9
8.2.2	C1123	REJUNTAMENTO COM ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	52,99	9,46	501,29	-14,80	45,00	30,20	22,79	56,99%	-R$ 140,01	R$ 425,70	R$ 285,6
8.3	**ACABAMENTOS PARA TETOS**						**9617.61**								

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,73
			ADITIVO: R$ 83.330,73
LOCAL: ALTO SANTO - CE			TOTAL: R$ 556.224,46
	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,67
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,79
			MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,46
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,00

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
8.3.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60)CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	202,04	36,57	7.388,60	62,89	139,15	202,04	0,00	100,00%	R$ 2.299,74	R$ 5.088,86	R$ 7.388,6
8.3.2	C4284	SANCA DE GESSO PARA FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	121,87	18,29	2.229,00	121,87	0,00	121,87	0,00	100,00%	R$ 2.229,00	R$ 0,00	R$ 2.229,0
9	**PISOS**						**R$ 74.173,27**						**R$ 6.065,47**	**R$ 45.246,51**	**R$ 51.311,9**
9.1	**PISOS INTERNOS**						**47866,08**								
9.1.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 PARA PISO	SEINFRA	M2	172,62	127,97	22.090,18	30,97	141,65	172,62	0,00	100,00%	R$ 3.962,66	R$ 18.127,53	R$ 22.090,1
9.1.2	C1123	REJUNTAMENTO COM ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	172,62	9,46	1.632,99	30,97	141,65	172,62	0,00	100,00%	R$ 292,93	R$ 1.340,05	R$ 1.632,9
9.1.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA COM PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	17,06	630,78	10.758,58		17,06	17,06	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 10.758,58	R$ 10.758,5
9.1.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	SEINFRA	M2	152,38	29,32	4.467,66		152,38	152,38	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 4.467,66	R$ 4.467,6
9.1.5	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25CM	SEINFRA	M	55,96	159,34	8.916,67		47,96	47,96	8,00	85,70%	R$ 0,00	R$ 7.641,95	R$ 7.641,9
9.2	**PISOS EXTERNOS**						**26307,19**								
9.2.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	456,96	57,57	26.307,19	31,44	50,56	82,00	374,96	17,94%	R$ 1.809,89	R$ 2.910,74	R$ 4.720,6
10	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						**R$ 9.462,07**						**R$ 720,76**	**R$ 4.841,00**	**R$ 5.561,7**

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,73
			ADITIVO: R$ 83.330,73
LOCAL: ALTO SANTO - CE			TOTAL: R$ 556.224,46
	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,67
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,79
			MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,46
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,00

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
10.1	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS						4186,91								
10.1.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	891,97	891,97		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 891,97	R$ 891,9
10.1.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	SEINFRA	M2	1,18	393,31	464,11	1,18	0,00	1,18	0,00	100,00%	R$ 464,11	R$ 0,00	R$ 464,1
10.1.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	12,42	12,42	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 12,42	R$ 0,00	R$ 12,4
10.1.4	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA	SEINFRA	UN	0,00	397,46	0,00		0,00	0,00	0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	0,00	545,19	0,00		0,00	0,00	0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES COM TUBO INOX PARA WC'S	SEINFRA	M	3,00	271,37	814,11	0,90	0,00	0,90	2,10	30,00%	R$ 244,23	R$ 0,00	R$ 244,2
10.1.7	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	2,00	63,45	126,90		0,00	0,00	2,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.8	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	53,88	107,76		0,00	0,00	2,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.9	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	43,41	86,82		0,00	0,00	2,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.10	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00	199,39	199,39		0,00	0,00	1,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.11	C3003	LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA	SEINFRA	UN	2,00	457,38	914,76		2,00	2,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 914,76	R$ 914,7

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,73
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,73
			TOTAL: R$ 556.224,46
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,67
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,79
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,46
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,00

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
10.1.12	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	133,69	133,69		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 133,69	R$ 133,6
10.1.13	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	192,08	384,16		0,00	0,00	2,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.14	C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	25,41	50,82		0,00	0,00	2,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.2	**EQUIPAMENTOS**						**2374,59**								
10.2.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	791,53	2.374,59		0,00	0,00	3,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.3	**POÇOS E CAIXAS**						**216.97**								
10.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	0,72	239,42	172,38		0,72	0,72	0,00	100,00%	R$ 0,00	172,38	172,38
10.3.2	C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	44,59	44,59		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 44,59	R$ 44,
10.4	**OUTROS ELEMENTOS**						**2683.60**								
10.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	0,00	4.956,61	0.00		0,00	0,00	0.00	0,00%	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0
10.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO. MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	257,78	1.288,90		5,00	5,00	0.00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.288,90	R$ 1.288
10.4.3	C1950	PONTO SANITÁRIO. MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	232,45	1.394,70		6,00	6,00	0.00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.394,70	R$ 1.394

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,73
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,73
			TOTAL: R$ 556.224,46
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,67
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,79
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,46
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,00

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**						**R$ 71.163,70**						**R$ 22.029,58**	**R$ 35.358,24**	**R$ 57.387,8**
11.1	**ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES**						**3420,12**								
11.1.1	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	132,00	25,91	3.420,12		132,00	132,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 3.420,12	R$ 3.420,
11.2	**QUADROS / CAIXAS**						**3397,66**								
11.2.1	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, SEM BARRAMENTO	SEINFRA	UN	12,00	83,45	1.001,40		12,00	12,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.001,40	R$ 1.001,
11.2.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95MM, COM BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	373,51	373,51		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 373,51	R$ 373,
11.2.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	0,00	104,58	0,00		0,00	0,00	0,00	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,
11.2.4	C4836	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10CM (30X 30X40CM), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	4,00	97,51	390,04		4,00	4,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 390,04	R$ 390
11.2.5	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.632,71	1.632,71		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.632,71	R$ 1.632
11.3	**FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS**						**14029,09**								
11.3.1	C1375	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 4MM2	SEINFRA	M	0,00	8,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0
11.3.2	C1376	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 6MM2	SEINFRA	M	842,40	9,81	8.263,98		842,40	842,40	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 8.263,98	R$ 8.263

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,73
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,73
			TOTAL: R$ 556.224,46
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,67
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,79
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,46
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,00

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
8.3.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60)CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	202,04	36,57	7.388,60	62,89	139,15	202,04	0,00	100,00%	R$ 2.299,74	R$ 5.088,86	R$ 7.388,60
8.3.2	C4284	SANCA DE GESSO PARA FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	121,87	18,29	2.229,00	121,87	0,00	121,87	0,00	100,00%	R$ 2.229,00	R$ 0,00	R$ 2.229,00
9	**PISOS**						**R$ 74.173,27**						**R$ 6.065,47**	**R$ 45.246,51**	**R$ 51.311,98**
9.1	**PISOS INTERNOS**						**47866,08**								
9.1.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 PARA PISO	SEINFRA	M2	172,62	127,97	22.090,18	30,97	141,65	172,62	0,00	100,00%	R$ 3.962,66	R$ 18.127,53	R$ 22.090,18
9.1.2	C1123	REJUNTAMENTO COM ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	172,62	9,46	1.632,99	30,97	141,65	172,62	0,00	100,00%	R$ 292,93	R$ 1.340,05	R$ 1.632,98
9.1.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA COM PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	17,06	630,78	10.758,58		17,06	17,06	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 10.758,58	R$ 10.758,58
9.1.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	SEINFRA	M2	152,38	29,32	4.467,66		152,38	152,38	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 4.467,66	R$ 4.467,66
9.1.5	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25CM	SEINFRA	M	55,96	159,34	8.916,67		47,96	47,96	8,00	85,70%	R$ 0,00	R$ 7.641,95	R$ 7.641,95
9.2	**PISOS EXTERNOS**						**26307,19**								
9.2.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	456,96	57,57	26.307,19	31,44	50,56	82,00	374,96	17,94%	R$ 1.809,89	R$ 2.910,74	R$ 4.720,63
10	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						**R$ 9.462,07**						**R$ 720,76**	**R$ 4.841,00**	**R$ 5.561,76**

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,7
			TOTAL: R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
10.1	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS						4186,91								
10.1.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	891,97	891,97		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 891,97	R$ 891,9
10.1.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	SEINFRA	M2	1,18	393,31	464,11	1,18	0,00	1,18	0,00	100,00%	R$ 464,11	R$ 0,00	R$ 464,1
10.1.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	12,42	12,42	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 12,42	R$ 0,00	R$ 12,4
10.1.4	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA	SEINFRA	UN	0,00	397,46	0,00		0,00	0,00	0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	0,00	545,19	0,00		0,00	0,00	0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES COM TUBO INOX PARA WC'S	SEINFRA	M	3,00	271,37	814,11	0,90	0,00	0,90	2,10	30,00%	R$ 244,23	R$ 0,00	R$ 244,2
10.1.7	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	2,00	63,45	126,90		0,00	0,00	2,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.8	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	53,88	107,76		0,00	0,00	2,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.9	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	43,41	86,82		0,00	0,00	2,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.10	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00	199,39	199,39		0,00	0,00	1,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.11	C3003	LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA	SEINFRA	UN	2,00	457,38	914,76		2,00	2,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 914,76	R$ 914,7

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,7
			TOTAL: R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
10.1.12	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	133,69	133,69		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 133,69	R$ 133,6
10.1.13	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	192,08	384,16		0,00	0,00	2,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.1.14	C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	25,41	50,82		0,00	0,00	2,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.2	**EQUIPAMENTOS**						**2374,59**								
10.2.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	791,53	2.374,59		0,00	0,00	3,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.3	**POÇOS E CAIXAS**						**216.97**								
10.3.1	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	0,72	239,42	172,38		0,72	0,72	0,00	100,00%	R$ 0,00	172,38	172,38
10.3.2	C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	44,59	44,59		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 44,59	R$ 44,5
10.4	**OUTROS ELEMENTOS**						**2683.60**								
10.4.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	0,00	4.956,61	0.00		0,00	0,00	0.00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
10.4.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO. MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	257,78	1.288,90		5,00	5,00	0.00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.288,90	R$ 1.288,9
10.4.3	C1950	PONTO SANITÁRIO. MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	232,45	1.394,70		6,00	6,00	0.00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.394,70	R$ 1.394,7

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,7
			TOTAL: R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**						**R$ 71.163,70**						**R$ 22.029,58**	**R$ 35.358,24**	**R$ 57.387,8**
11.1	**ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES**						**3420,12**								
11.1.1	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	132,00	25,91	3.420,12		132,00	132,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 3.420,12	R$ 3.420,1
11.2	**QUADROS / CAIXAS**						**3397,66**								
11.2.1	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, SEM BARRAMENTO	SEINFRA	UN	12,00	83,45	1.001,40		12,00	12,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.001,40	R$ 1.001,4
11.2.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95MM, COM BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	373,51	373,51		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 373,51	R$ 373,5
11.2.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	0,00	104,58	0,00		0,00	0,00	0,00	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
11.2.4	C4836	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10CM (30X 30X40CM), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	4,00	97,51	390,04		4,00	4,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 390,04	R$ 390,0
11.2.5	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.632,71	1.632,71		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.632,71	R$ 1.632,71
11.3	**FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS**						**14029,09**								
11.3.1	C1375	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 4MM2	SEINFRA	M	0,00	8,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
11.3.2	C1376	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 6MM2	SEINFRA	M	842,40	9,81	8.263,98		842,40	842,40	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 8.263,98	R$ 8.263,9

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,7
			TOTAL: R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.3.3	C1372	FIO ISOLADO PVC PARA 750V 10MM2	SEINFRA	M	140,00	12,77	1.787,80		140,00	140,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.787,80	R$ 1.787,8
11.3.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	596,66	6,67	3.977,31		396,00	396,00	200,66	66,37%	R$ 0,00	R$ 2.639,72	R$ 2.639,7
11.4	**BASES, CHAVES E DISJUNTORES**						**1552,74**								
11.4.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	28,00	24,97	699.16	18,00	10,00	28,00	0,00	100,00%	R$ 449,46	R$ 249,70	R$ 699,1
11.4.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	11,00	24,97	274.67	6,00	5,00	11,00	0,00	100,00%	R$ 149,82	R$ 124,85	R$ 274,6
11.4.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	12,00	24,97	299,64	7,00	5,00	12,00	0,00	100,00%	R$ 174,79	R$ 124,85	R$ 299,6
11.4.4	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA	SEINFRA	UN	1,00	279,27	279.27		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 279,27	R$ 279,2
11.5	**TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS**						**2447.02**								
11.5.1	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	25,55	51.10	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	R$ 51,10	R$ 0,00	R$ 51,1
11.5.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	14,00	18,62	260.68	14,00	0,00	14,00	0,00	100,00%	R$ 260,68	R$ 0,00	R$ 260,6
11.5.3	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	46,91	93.82	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	R$ 93,82	R$ 0,00	R$ 93,8
11.5.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	32,85	32.85		0,00	0,00	1,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,7
			TOTAL: R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.5.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	46,38	46,38	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 46,38	R$ 0,00	R$ 46,3
11.5.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	19,60	235,20		0,00	0,00	12,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
11.5.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	53,00	28,64	1.517,92	11,00	23,00	34,00	19,00	64,15%	R$ 315,04	R$ 658,72	R$ 973,7
11.5.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	9,00	23,23	209.07		9,00	9,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 209,07	R$ 209,0
11.6	**LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS**						**6960.09**								
11.6.1	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	52,00	44,50	2.314,00	21,00	18,00	39,00	13,00	75,00%	R$ 934,50	R$ 801,00	R$ 1.735,5
11.6.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	5,00	310,21	1.551,05	2,00	0,00	2,00	3,00	40,00%	R$ 620,42	R$ 0,00	R$ 620,4
11.6.3	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES COM LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	32,00	54,52	1.744,64	5,00	20,00	25,00	7,00	78,13%	R$ 272,60	R$ 1.090,40	R$ 1.363,0
11.6.4	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÓNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	15,00	90,03	1.350,40	14,00	0,00	14,00	1.00	93,33%	R$ 1.260,37	R$ 0,00	R$ 1.260,3
11.7	**OUTROS ELEMENTOS**						**37093.65**								
11.7.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	317,29	317,29		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 317,29	R$ 317,2
11.7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO. MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	107,00	276,20	29.553,40	63,00	26,00	89,00	18,00	83,18%	R$ 17.400,60	R$ 7.181,20	R$ 24.581,8

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061862573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,7
			TOTAL: R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.7.3	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	34,00	212,44	7.222,96		12,00	12,00	22,00	35,29%	R$ 0,00	R$ 2.549,28	R$ 2.549,2
11.8	**OUTROS ELEMENTOS**						**2263,33**		0,00						
11.8.1	C2015	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 20,01 À 25 KW	SEINFRA	UN	1,00	2.263,33	2.263,33		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 2.263,33	R$ 2.263,3
12	**PINTURA**						**R$ 24.687,9**						**R$ 24.354,96**	**R$ 0,00**	**R$ 24.354,9**
12.1	**PAREDES E FORROS**						**24687,87**								
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	248,18	14,25	3.536,57	248,18	0,00	248,18	0,00	100,00%	R$ 3.536,57	R$ 0,00	R$ 3.536,5
12.1.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	106,05	18,14	1.923,75	106,05	0,00	106,05	0,00	100,00%	R$ 1.923,75	R$ 0,00	R$ 1.923,7
12.1.3	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA	SEINFRA	M2	558,90	28,60	15.984,54	547,26	0,00	547,26	11,64	97,92%	R$ 15.651,64	R$ 0,00	R$ 15.651,6
12.1.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA	SEINFRA	M2	106,05	30,58	3.243,01	106,05	0,00	106,05	0,00	100,00%	R$ 3.243,01	R$ 0,00	R$ 3.243,0
12.2	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**						**0,00**								
12.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,00	24,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
12.3	**SUPERFÍCIES METÁLICAS**						**0,00**								

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,7
			TOTAL: R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
12.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,00	45,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
13	**URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO**						**R$ 704,21**						**R$ 704,21**	**R$ 0,00**	**R$ 704,2**
13.1	**PAISAGISMO**						**704,21**								
13.1.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	33,84	20,81	704.21	33,84	0,00	33,84	0,00	100,00%	R$ 704,21	R$ 0,00	R$ 704,2
14	**ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS**						**R$ 1.412,81**						**R$ 0,00**	**R$ 1.233,58**	**R$ 1.233,5**
14.1	**INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS**						**1412,81**								
14.1.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES COM ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	1.233,58	1.233,58		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 1.233,58	R$ 1.233,5
14.1.2	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	1,30	12,79	16.63		0,00	0,00	1,30	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
14.1.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	3,00	54,20	162.60		0,00	0,00	3,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
15	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**						**R$ 19.103,24**						**R$ 4.775,81**	**R$ 14.327,43**	**R$ 19.103,2**
15.1	**ADMINISTRAÇÃO**						**19103,24**								
15.1.1	CP-0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE OBRAS		MÊS	4,00	4.775,81	19.103,24	1,00	3,00	4,00	0,00	100,00%	R$ 4.775,81	R$ 14.327,43	R$ 19.103,2

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,7
			ADITIVO: R$ 83.330,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			TOTAL: R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.5.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	46,38	46,38	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 46,38	R$ 0,00	R$ 46,3
11.5.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	19,60	235,20		0,00	0,00	12,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
11.5.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	53,00	28,64	1.517,92	11,00	23,00	34,00	19,00	64,15%	R$ 315,04	R$ 658,72	R$ 973,7
11.5.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	9,00	23,23	209,07		9,00	9,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 209,07	R$ 209,0
11.6	**LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS**						**6960,09**								
11.6.1	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	52,00	44,50	2.314,00	21,00	18,00	39,00	13,00	75,00%	R$ 934,50	R$ 801,00	R$ 1.735,5
11.6.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	5,00	310,21	1.551,05	2,00	0,00	2,00	3,00	40,00%	R$ 620,42	R$ 0,00	R$ 620,4
11.6.3	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES COM LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	32,00	54,52	1.744,64	5,00	20,00	25,00	7,00	78,13%	R$ 272,60	R$ 1.090,40	R$ 1.363,0
11.6.4	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	15,00	90,03	1.350,40	14,00	0,00	14,00	1,00	93,33%	R$ 1.260,37	R$ 0,00	R$ 1.260,3
11.7	**OUTROS ELEMENTOS**						**37093.65**								
11.7.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	317,29	317,29		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 317,29	R$ 317,2
11.7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	107,00	276,20	29.553,40	63,00	26,00	89,00	18,00	83,18%	R$ 17.400,60	R$ 7.181,20	R$ 24.581,8

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO: R$ 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO: R$ 83.330,7
			TOTAL: R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL: R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS: R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO: R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
11.7.3	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	34,00	212,44	7.222,96		12,00	12,00	22,00	35,29%	R$ 0,00	R$ 2.549,28	R$ 2.549,2
11.8	**OUTROS ELEMENTOS**						**2263,33**		0,00						
11.8.1	C2015	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 20,01 À 25 KW	SEINFRA	UN	1,00	2.263,33	2.263,33		1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ 0,00	R$ 2.263,33	R$ 2.263,3
12	**PINTURA**						**R$ 24.687,9**						**R$ 24.354,96**	**R$ 0,00**	**R$ 24.354,9**
12.1	**PAREDES E FORROS**						**24687,87**								
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	248,18	14,25	3.536,57	248,18	0,00	248,18	0,00	100,00%	R$ 3.536,57	R$ 0,00	R$ 3.536,5
12.1.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	106,05	18,14	1.923,75	106,05	0,00	106,05	0,00	100,00%	R$ 1.923,75	R$ 0,00	R$ 1.923,7
12.1.3	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA	SEINFRA	M2	558,90	28,60	15.984,54	547,26	0,00	547,26	11,64	97,92%	R$ 15.651,64	R$ 0,00	R$ 15.651,6
12.1.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA	SEINFRA	M2	106,05	30,58	3.243,01	106,05	0,00	106,05	0,00	100,00%	R$ 3.243,01	R$ 0,00	R$ 3.243,0
12.2	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**						**0,00**								
12.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,00	24,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0
12.3	**SUPERFÍCIES METÁLICAS**						**0,00**								

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE .	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-TP - CMAS	QUARTA MEDIÇÃO	VALORES	
OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.			CONTRATO:	R$ 472.893,7
LOCAL: ALTO SANTO - CE			ADITIVO:	R$ 83.330,7
			TOTAL:	R$ 556.224,4
TABELA: SEINFRA 027.1 C/DESONERAÇÃO	CONTRATO Nº: 2022101101	PERÍODO: 08/03/2023 A 20/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL:	R$ 67.788,6
			VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	R$ 374.441,7
BDI: 22,76%	MAPP: XXXX	MEDIÇÃO: 19/12/2022	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	R$ 442.230,4
			SALDO DO CONTRATO:	R$ 113.994,0

QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO READEQUADO					QUANTIDADES EXECUTADAS / SALDO					VALORES MEDIDOS (R$)		
			FONTE	UN	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	SALDO	PERC. MEDIDO %	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
	VALOR TOTAL														

VALOR DO CONTRATO ADITIVADO	R$ 556.224,4
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	R$ 67.788,6
VALOR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES	R$ 374.441,7
VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	R$ 442.230,4
SALDO DO CONTRATO	R$ 113.994,0

4ºMEDIÇÃO NO VALOR DE R$ 67.788.67 (Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Oitent e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos).

JAGUARIBE - CE, 20 DE JUNHO DE 2023.

Samuel Bruno Sousa de Freitas

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



MEMORIAL DE CALCULO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA INSTITUCIONAL	10/09/2022	BDI CALCULADO %
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, CENTRO, ALTO SANTO-CE, 62970-000	FONTE	HORA %
PROPRIETÁRIO:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	83,85
EMPRESA:	CONSTRUTORA EXETO	SINAPI	83,85

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO					UN
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						
5.2	ESQUADRIAS METÁLICAS						
5.2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,					M2
				QTDE	L (M)	H (M)	QTD.
JANELAS WC´S				4,00	0,45	0,48	0,86
				TOTAL			**0,86**

6	VIDROS						
6.1	CRISTAL TEMPERADO						
6.1.2	C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m					CJ
ESQUADRIAS						UN	QTD.
PORTA PRINCIPAL						1,00	1,00
				TOTAL			**1,00**

8	REVESTIMENTOS						
8.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						
8.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR					M2
PANOS				L (M)	H (M)	FACES	QTD.
PANO 01	L*H*FACES	FACHADA 01		20,01	5,30	2,00	212,11
PANO 02	L*H*FACES	FACHADA 02		18,09	5,30	2,00	191,75
PANO 03	L*H*FACES	LAT. MAIOR		27,85	2,10	2,00	116,97
PANO 05	L*H*FACES	LAT./FUND.		4,50	4,37	2,00	39,33
PANO 06	L*H*FACES	WC'S/REC.		3,18	3,95	2,00	25,12
PANO 07	L*H*FACES	GAB. PRES.		4,35	4,37	2,00	38,02
PANO 08	L*H*FACES	WC PRES.		1,45	3,95	2,00	11,46
PANO 09	L*H*FACES	WC PNE		1,50	3,95	2,00	11,85
PANO 10	L*H*FACES	COMP. MUR. FUND.		4,75	4,37	2,00	41,52
				TOTAL EXECUTADO			688,130
				TOTAL MEDIDO			635,090
				QUANTIDADE A MEDIR			**53,03**

8.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,					M2
PANOS				L (M)	H (M)	UN	QTD.
PANO 01	L*H*FACES	FACHADA 01		20,01	5,30	2,00	212,11
PANO 02	L*H*FACES	FACHADA 02		18,09	5,30	2,00	191,75
PANO 03	L*H*FACES	LAT. MAIOR		27,85	2,10	2,00	116,97
PANO 05	L*H*FACES	LAT./FUND.		4,50	4,37	2,00	39,33
PANO 06	L*H*FACES	WC'S/REC.		3,18	3,95	2,00	25,12
PANO 07	L*H*FACES	GAB. PRES.		4,35	4,37	2,00	38,02
PANO 10	L*H*FACES	COMP. MUR. FUND.		4,75	4,37	2,00	41,52
				TOTAL EXECUTADO			664,820
				TOTAL MEDIDO			663,000
				QUANTIDADE A MEDIR			**1,82**

8.2	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						
8.2.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA					M2
AMBIENTES			P (M)	C (M)	L (M)	H (M)	QTD.
WC PRES.	P*H		7,00	1,30	2,20	1,80	12,60
WC PNE	P*H		7,80	2,40	1,50	1,80	14,04
				TOTAL EXECUTADO			**26,64**
				TOTAL MEDIDO			**41,44**
				QUANTIDADE A MEDIR			**-14,80**

8.2.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM					M2
AMBIENTES			P (M)	C (M)	L (M)	H (M)	QTD.
WC PRES.	P*H		7,00	1,30	2,20	1,80	12,60
WC PNE	P*H		7,80	2,40	1,50	1,80	14,04
				TOTAL EXECUTADO			26,64
				TOTAL MEDIDO			41,44
				QUANTIDADE A MEDIR			**-14,80**

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS



MEMORIAL DE CALCULO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA INSTITUCIONAL	10/09/2022	BDI CALCULADO %
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, CENTRO, ALTO SANTO-CE, 62970-000	FONTE	HORA %
PROPRIETÁRIO:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	83,85
EMPRESA:	CONSTRUTORA EXETO	SINAPI	83,85

8.3	**ACABAMENTOS PARA TETOS**						
8.3.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME					M2
TRECHOS					C (M)	L (M)	QTD.
TRECHO 01	C*L				24,87	4,35	108,18
TRECHO 02	C*L				1,54	20,11	30,97
TRECHO 03	C*L				3,83	2,20	8,43
TRECHO 04	C*L/2				1,28	4,35	2,78
SALA - 02	LAD. DA RECEPÇÃO				4,20	3,80	15,96
SALA - 03	SECRETARIA				3,20	7,60	24,32
CORREDOR	ACESSO A COZINHA				1,50	7,60	11,40
				TOTAL EXECUTADO			202,04
				TOTAL MEDIDO			139,15
				QUANTIDADE A MEDIR			**62,89**

8.3.2	C4284	SANCA DE GESSO PARA FORRO CONVENCIONAL -				M
TRECHOS				C (M)		QTD.
DETALHE - 01 PROJETO/FACHADA	COMPRIMENTO			20,01		20,01
DETALHE - 01 PROJETO/FACHADA	LAD. OESTE			11,00		11,00
DETALHE - 02 PROJETO/FACHADA	PAREDE			6,50		6,50
DETALHE - 03 PROJETO/FACHADA	PAREDE			8,92		8,92
DETALHE - 05 PROJETO/FACHADA	PAREDE			22,74		22,74
DETALHE - 06 PROJETO/FACHADA	PAREDE			23,00		23,00
DETALHE - 07 PROJETO/FACHADA	PILARES			11,20		11,20
DETALHE - 08 PROJETO/FACHADA	PILARES			11,20		11,20
DETALHE - 09 PROJETO/FACHADA	PORTA DE ENTRADA			7,30		7,30
			TOTAL EXECUTADO			121,87
			TOTAL MEDIDO			0,00
			QUANTIDADE A MEDIR			**121,87**

9	**PISOS**					
9.1	**PISOS INTERNOS**					
9.1.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA				M2
TRECHOS				C (M)	L (M)	QTD.
TRECHO 01	C*L			24,87	4,35	108,18
TRECHO 02	C*L			1,54	20,11	30,97
TRECHO 03	C*L			3,83	2,20	8,43
TRECHO 04	C*L/2			1,28	4,35	2,78
DESNÍVEL EXISRTENTE - SALA				4,20	3,80	15,96
CORREDOR				1,50	4,20	6,30
			TOTAL EXECUTADO			172,62
			TOTAL MEDIDO			141,65
			QUANTIDADE A MEDIR			**30,97**

9.1.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM				M2
TRECHOS				C (M)	L (M)	QTD.
TRECHO 01	C*L			24,87	4,35	108,18
TRECHO 02	C*L			1,54	20,11	30,97
TRECHO 03	C*L			3,83	2,20	8,43
TRECHO 04	C*L/2			1,28	4,35	2,78
DESNÍVEL EXISRTENTE - SALA				4,20	3,80	15,96
CORREDOR				1,50	4,20	6,30
			TOTAL EXECUTADO			172,62
			TOTAL MEDIDO			141,65
			QUANTIDADE A MEDIR			**30,97**

9.2	PISOS EXTERNOS						
9.2.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA					M2
PISO EXTERNO				C (M)	L (M)	LADOS	QTD.
	C*L			20,51	5,80		118,96
DESCONTO	P*UN		18,48	3,30	5,94	2,00	-36,96
				TOTAL EXECUTADO			82,00
				TOTAL MEDIDO			50,56
				QUANTIDADE A MEDIR			**31,44**

10	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	

10.1.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM					UN
	WC					UN	QTD.
RECEPÇÃO	(C+L)*L2			1,55	1,83	0,35	1,18



MEMORIAL DE CALCULO

		10/09/2022	BDI CALCULADO %
OBRA:	PROJETO DE REFORMA INSTITUCIONAL	FONTE	HORA %
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, CENTRO, ALTO SANTO-CE, 62970-000	SEINFRA	83,85
PROPRIETÁRIO:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SINAPI	83,85
EMPRESA:	CONSTRUTORA EXETO		

					TOTAL		1,18
10.1.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)					UN
	WC					UN	QTD.
WC PRESIDENTE						1,00	1,00
					TOTAL		1,00
10.1.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES COM TUBO INOX PARA WC'S					UN
	WC			C (M)		QTDE	QTD.
WC				0,45		2,00	0,90
					TOTAL		0,90

11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE						
11.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES						
11.4.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A					UN
ILUMINAÇÃO/TOMADAS						UN	QTD.
10 GABINETES						25,00	25,00
GABINETE PRESIDENTE						1,00	1,00
QD GERAL						2,00	2,00
					TOTAL EXECUTADO		28,00
					TOTAL MEDIDO		10,00
					QUANTIDADE A MEDIR		18,00
11.4.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A					UN
AR-CONDICIONADO						UN	QTD.
	UN					11,00	11,00
					TOTAL EXECUTADO		11,00
					TOTAL MEDIDO		5,00
					QUANTIDADE A MEDIR		6,00
11.4.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A					UN
ILUMINAÇÃO/TOMADAS						UN	QTD.
PRESIDENTE	UN					2,00	2,00
SOCIAL	UN					10,00	10,00
					TOTAL EXECUTADO		12,00
					TOTAL MEDIDO		5,00
					QUANTIDADE A MEDIR		7,00

11.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS						
11.5.1	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V					UN
						UN	QTD.
CORREDOR PEQUENO						2,00	2,00
					TOTAL		2,00
11.5.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V					UN
						UN	QTD.
RECEPÇÃO						1,00	1,00
WC PRESIDENTE						1,00	1,00
WC						1,00	1,00
GABINETES						11,00	11,00
					TOTAL		14,00
11.5.3	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V					UN
						UN	QTD.
4°MEDIÇÃO NO VALOR DE R$						2,00	2,00
					TOTAL		2,00
11.5.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V					UN
						UN	QTD.
ILUMINAÇÃO EXTERNA						1,00	1,00
					TOTAL		1,00
11.5.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V					UN
SALAS						UN	QTD.
SALA 01 PRESIDENTE						6,00	6,00
SALA 02						2,00	2,00
SALA 03						2,00	2,00
SALA 04						2,00	2,00
SALA 05						2,00	2,00



MEMORIAL DE CALCULO

		10/09/2022	BDI CALCULADO %
OBRA:	PROJETO DE REFORMA INSTITUCIONAL	**FONTE**	**HORA %**
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, CENTRO, ALTO SANTO-CE, 62970-000	SEINFRA	83,85
PROPRIETÁRIO:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SINAPI	83,85
EMPRESA:	CONSTRUTORA EXETO		

SALA 06						2,00	2,00
SALA 07						2,00	2,00
SALA 08						2,00	2,00
SALA 09						2,00	2,00
SALA 10						2,00	2,00
SALA 11						2,00	2,00
RECEPÇÃO						6,00	6,00
CORREDOR/ ACESSOS						2,00	2,00
				TOTAL EXECUTADO			34,00
				TOTAL MEDIDO			23,00
				QUANTIDADE A MEDIR			**11,00**

11.6	**LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS**						
11.6.1	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE					UN
SALAS						UN	QTD.
SALA 01						2,00	2,00
SALA 02						1,00	1,00
SALA 03						1,00	1,00
SALA 04						1,00	1,00
SALA 05						1,00	1,00
SALA 06						1,00	1,00
SALA 07						1,00	1,00
SALA 08						1,00	1,00
SALA 09						1,00	1,00
SALA 10						1,00	1,00
SALA 11						1,00	1,00
WC PRES.						1,00	1,00
WC PNE						1,00	1,00
SALA EXISTENTE 01						1,00	1,00
SALA EXISTENTE 02						2,00	2,00
CORREDOR PEQUENO						1,00	1,00
CORREDOR GRANDE						6,00	6,00
CORREDOR PLENARIO						2,00	2,00
RECEPÇÃO						7,00	7,00
FACHADA						6,00	6,00
				TOTAL EXECUTADO			39,00
				TOTAL MEDIDO			18,00
				QUANTIDADE A MEDIR			**21,00**

11.6.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA					UN
SALAS						UN	QTD.
RECEPÇÃO/CORREDOR						2,00	2,00
				TOTAL			**2,00**

11.6.3	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE					UN
SALAS						UN	QTD.
SALA 01	UN					5,00	5,00
SALA 02	UN					2,00	2,00
SALA 03	UN					2,00	2,00
SALA 04	UN					2,00	2,00
SALA 05	UN					2,00	2,00
SALA 06	UN					2,00	2,00
SALA 07	UN					2,00	2,00
SALA 08	UN					2,00	2,00
SALA 09	UN					2,00	2,00
SALA 10	UN					2,00	2,00
SALA 11	UN					2,00	2,00
				TOTAL EXECUTADO			25,00
				TOTAL MEDIDO			20,00
				QUANTIDADE A MEDIR			**5,00**

11.6.4	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA					UN
						UN	QTD.
FACHADA						14,00	14,00
				TOTAL			**14,00**

11.7	**OUTROS ELEMENTOS**						
11.7.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M					UN
GERAL						UN	QTD.
	UN					1,00	1,00



MEMORIAL DE CALCULO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA INSTITUCIONAL	10/09/2022	BDI CALCULADO %
		FONTE	HORA %
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, CENTRO, ALTO SANTO-CE, 62970-000	SEINFRA	83,85
		SINAPI	83,85
PROPRIETÁRIO:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE		
EMPRESA:	CONSTRUTORA EXETO		
	TOTAL	**1,00**	

11.7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					PT
		TOMADAS				UN	QTD.
SALA 01	UN					6,00	6,00
SALA 02	UN					2,00	2,00
SALA 03	UN					2,00	2,00
SALA 04	UN					2,00	2,00
SALA 05	UN					2,00	2,00
SALA 06	UN					2,00	2,00
SALA 07	UN					2,00	2,00
SALA 08	UN					2,00	2,00
SALA 09	UN					2,00	2,00
SALA 10	UN					2,00	2,00
SALA 11	UN					2,00	2,00
WC PRES.	UN					6,00	6,00
WC PNE	UN					2,00	2,00
		LUMINARIAS INTERNAS				UN	QTD.
SALA 01						2,00	2,00

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4



MEMORIAL DE CALCULO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA INSTITUCIONAL
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, CENTRO, ALTO SANTO-CE, 62970-000
PROPRIETÁRIO:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
EMPRESA:	CONSTRUTORA EXETO

10/09/2022	BDI CALCULADO %
FONTE	**HORA %**
SEINFRA	83,85
SINAPI	83,85

SALA 02						1,00	1,00
SALA 03						1,00	1,00
SALA 04						1,00	1,00
SALA 05						1,00	1,00
SALA 06						1,00	1,00
SALA 07						1,00	1,00
SALA 08						1,00	1,00
SALA 09						1,00	1,00
SALA 10						1,00	1,00
SALA 11						1,00	1,00
WC PRES.						1,00	1,00
WC PNE						1,00	1,00
SALA EXISTENTE 01						1,00	1,00
SALA EXISTENTE 02						2,00	2,00
CORREDOR PEQUENO						1,00	1,00
CORREDOR GRANDE						6,00	6,00
CORREDOR PLENARIO						2,00	2,00
RECEPÇÃO						7,00	7,00
FACHADA						6,00	6,00
ILUMINAÇÃO DA FACHADA EXTERNA						14,00	14,00
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA						2	2,00
					TOTAL EXECUTADO		89,00
					TOTAL MEDIDO		26,00
					QUANTIDADE A MEDIR		**63,00**

12	**PINTURA**						
12.1	PAREDES E FORROS						
12.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA					M2
PANOS - ALVENARIA				L (M)	H (M)	UN	QTD.
PANO 01	L*H*UN	FACHADA 02		20,01	5,30	1,00	106,04
PANO 03	L*H*UN	LAT. MAIOR		27,85	2,10	1,00	58,49
PANO 05	L*H*UN	LAT./FUND.		4,50	4,37	1,00	19,67
PANO 06	L*H*UN	WC'S/REC.		3,18	3,95	1,00	12,56
PANO 07	L*H*UN	GAB. PRES.		4,35	4,37	1,00	19,01
PANO 08	L*H*UN	WC PRES.		1,45	3,95	1,00	5,73
PANO 09	L*H*UN	WC PNE		1,50	3,95	1,00	5,93
PANO 10	L*H*UN	COMP. MUR. FUND.		4,75	4,37	1,00	20,75
					TOTAL		**248,18**

12.1.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA					M2
PANOS - ALVENARIA				L (M)	H (M)	FACES	QTD.
PANO 01	L*H*FACES			20,01	5,30	1,00	106,05
					TOTAL		**106,05**

12.1.3	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA					M2
PANOS DE ALVENARIA				L (M)	H (M)	FACES	QTD.
PANO 01	L*H*UN	FACHADA 02		20,01	5,30	1,00	106,05
PANO 03	L*H*UN	LAT. MAIOR		27,85	2,10	1,00	58,49
PANO 05	L*H*UN	LAT./FUND.		4,50	4,37	1,00	19,67
PANO 06	L*H*UN	WC'S/REC.		3,18	3,95	1,00	12,56
PANO 07	L*H*UN	GAB. PRES.		4,35	4,37	1,00	19,01
PANO 10	L*H*UN	COMP. MUR. FUND.		4,75	4,37	1,00	20,76
-	FACE INTERNA	CORREDOR ANTIGO		7,60	2,80	2,00	42,56
-	FACE INTERNA	SALA - 02		7,50	2,80	2,00	42,00
-	FACE INTERNA	SALA - 03		9,00	2,80	2,00	50,40
PANOS - GESSO							
PANO 04	L*H*UN	LAT. MENOR		26,40	3,00	1,00	79,20
PANO 06	L*H*UN	SALA 03/CORR.		3,18	3,95	1,00	12,56
PANO 11	L*H*UN	GABINETES		2,80	3,00	10,00	84,00
					TOTAL		**547,26**

12.1.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA					M2
PANOS - ALVENARIA				L (M)	H (M)	FACES	QTD.
PANO 01	L*H*FACES			20,01	5,30	1,00	106,05
					TOTAL		**106,05**

13	**URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO**						
13.1	PAISAGISMO						
13.1.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO					M2
				L (M)	H (M)	FACES	QTD.
JARDIM EXTERNO				3,00	5,64	2,00	33,84

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA



MEMORIAL DE CALCULO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA INSTITUCIONAL	10/09/2022	**BDI CALCULADO %**
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, CENTRO, ALTO SANTO-CE, 62970-000	**FONTE**	**HORA %**
PROPRIETÁRIO:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	83,85
EMPRESA:	CONSTRUTORA EXETO	SINAPI	83,85
	TOTAL		**33,84**

15	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**						
15.1	**ADMINISTRAÇÃO**						
15.1.1	CP-0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO DE OBRAS					MÊS
GERAL						UN	QTD.
MESES	UN					1,00	1,00
					TOTAL		**1,00**

VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 061863573-4

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93

Fone: (88) 3522-2713

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS
CONTRATO Nº 2022101101
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/03/2023 Á 20/06/2023 - 4º MEDIÇÃO

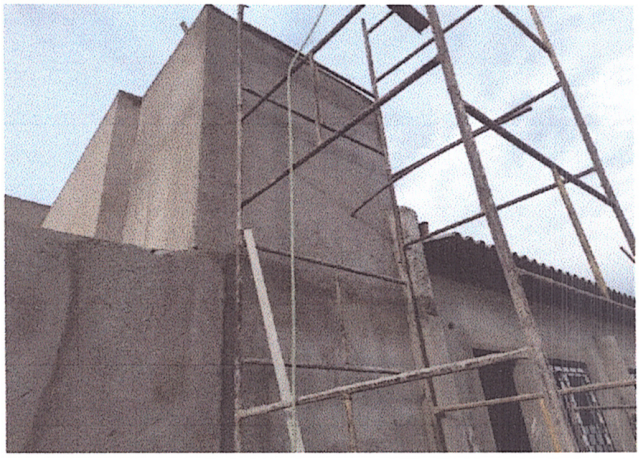

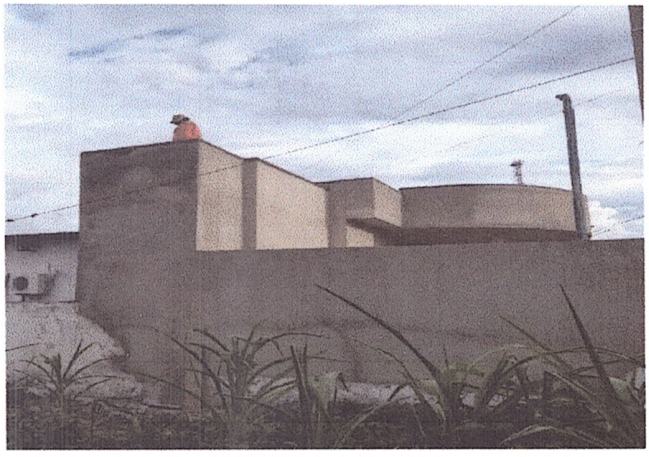

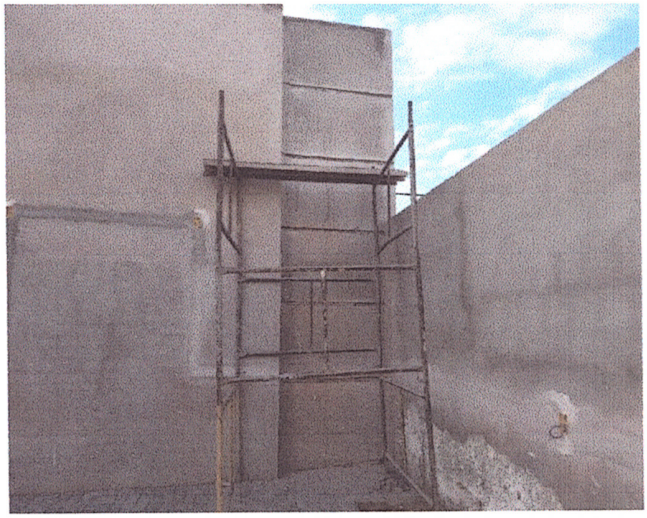



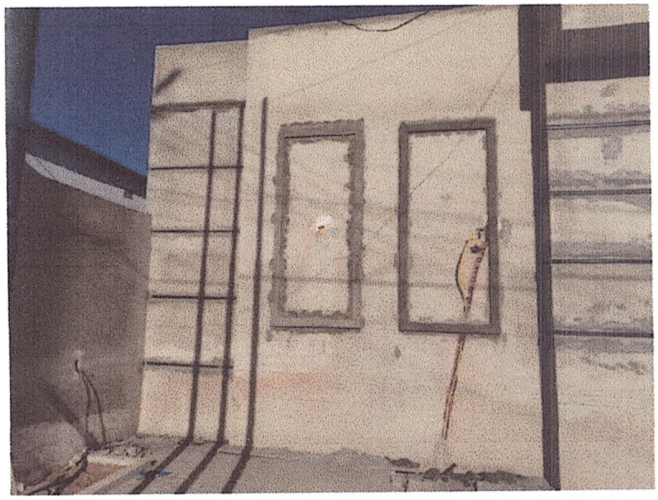



CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93

Fone: (88) 3522-2713

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS
CONTRATO Nº 2022101101
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/03/2023 Á 20/06/2023 - 4º MEDIÇÃO













CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.268/0001-93

Fone: (88) 3522-2713

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS
CONTRATO Nº 2022101101
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/03/2023 Á 20/06/2023 - 4º MEDIÇÃO

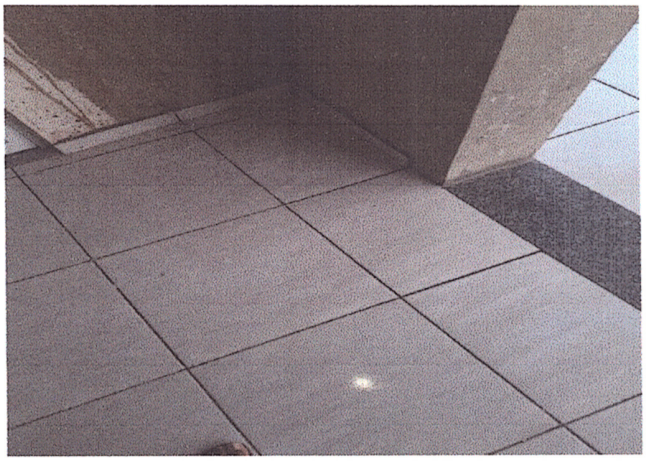

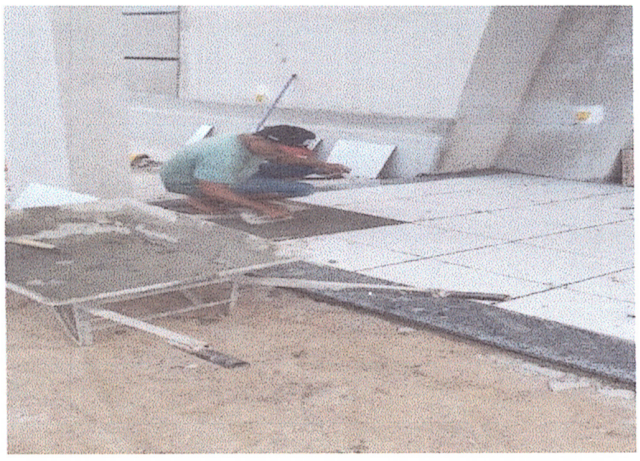









CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93

Fone: (88) 3522-2713

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS
CONTRATO Nº 2022101101
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/03/2023 Á 20/06/2023 - 4º MEDIÇÃO





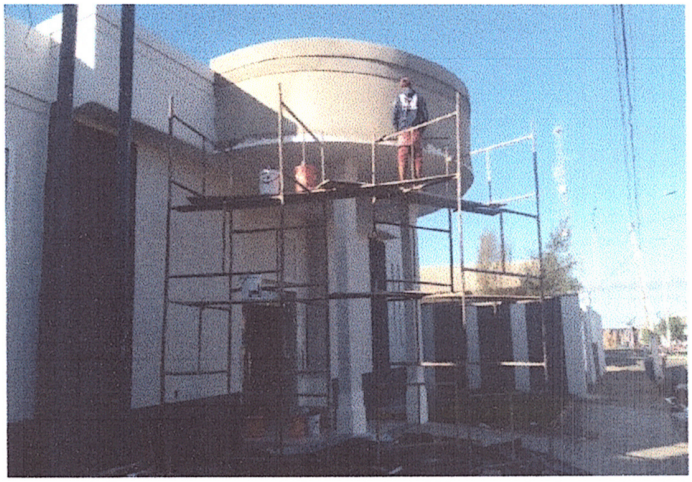







CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93

Fone: (88) 3522-2713

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS
CONTRATO Nº 2022101101
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/03/2023 Á 20/06/2023 - 4º MEDIÇÃO













CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93
Fone: (88) 3522-2713

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92.
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-TP-CMAS
CONTRATO Nº 2022101101
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/03/2023 Á 20/06/2023 - 4º MEDIÇÃO











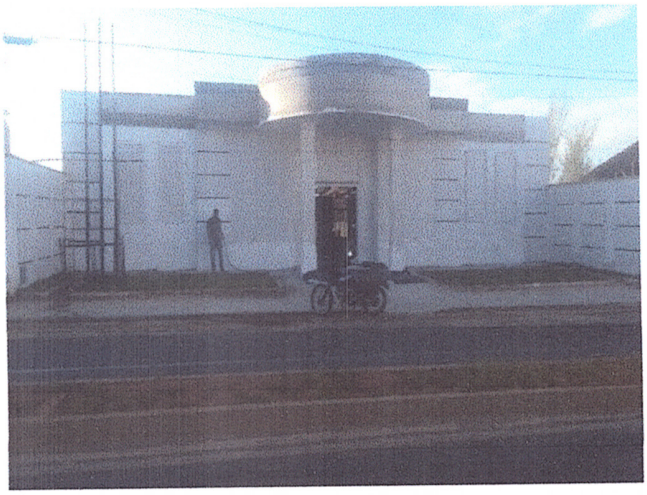



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**148,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**08/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**QUARTA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**32,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - RETOMADA DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - RETOMADA DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**149,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**09/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**QUINTA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**31,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**150,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**10/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**SEXTA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**30,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**151,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**11/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**SÁBADO**
	SALDO DE DIAS:	**29,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**152,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**12/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**DOMINGO**
	SALDO DE DIAS:	**28,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PARALIZAÇÃO DE OBRA

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**153,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**13/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**SEGUNDA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**27,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**154,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**14/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**TERÇA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**26,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**155,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**15/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**QUARTA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**25,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061833573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**156,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**16/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**QUINTA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**24,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061833573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**157,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**17/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**SEXTA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**23,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	20/12/2022 Á 27/03/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	158,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	18/03/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SÁBADO
	SALDO DE DIAS:	22,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061963573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**159,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**19/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**DOMINGO**
	SALDO DE DIAS:	**21,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PARALIZAÇÃO DE OBRA

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**160,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**20/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**SEGUNDA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**20,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - RETOMADA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -RETOMADA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**161,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**21/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**TERÇA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**19,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**162,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**22/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**QUARTA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**18,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**163,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**23/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**QUINTA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**17,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**164,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**24/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**SEXTA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**16,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**165,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**25/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**SÁBADO**
	SALDO DE DIAS:	**15,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**166,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**26/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**DOMINGO**
	SALDO DE DIAS:	**14,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PARALIZAÇÃO DE OBRA

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	**Assinatura Fiscalização/Supervisão**
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**167,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**27/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**SEGUNDA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**13,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**168,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**28/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**TERÇA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**12,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**169,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**29/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**QUARTA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**11,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**170,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**30/03/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**QUINTA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**10,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA		
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	2022101101
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	001/2022-TP-CMAS
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	20/12/2022 Á 27/03/2023
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	171,00
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	31/03/2023
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	SEXTA FEIRA
	SALDO DE DIAS:	9,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**172,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**01/04/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**SÁBADO**
	SALDO DE DIAS:	**8,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061963573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**173,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**02/04/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**DOMINGO**
	SALDO DE DIAS:	**7,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1- PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**174,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**03/04/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**SEGUNDA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**6,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**175,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**04/04/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**TERÇA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**5,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**176,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**05/04/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**QUARTAFEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**4,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**177,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**06/04/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**QUINTA FEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**3,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.1 - FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO
1.2 - RETOMADA DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - RETOMADA DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -RETOMADA DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**178,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**07/04/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**SEXTAFEIRA**
	SALDO DE DIAS:	**2,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - PAREDES E PAINÉIS
1.2 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REBOCO
1.3 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CHAPISCO
1.4 - FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMANTO CERÂMICO NA PAREDE
2 - PISOS
2.1 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO
2.2 -PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
3 - SISTEMA HIDROSANITÁRIO
3.1 - PARALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICOS
5 - ACABAMENTOS PARA TETOS
5.1 - PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL
6 - ESQUADRIAS
6.1 -CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE JANELAS DE ALUMINIO

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**179,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**08/04/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**SÁBADO**
	SALDO DE DIAS:	**1,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PARALIZAÇÃO DE OBRA

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	**Assinatura Fiscalização/Supervisão**
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4



DIÁRIO DE OBRA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. CNPJ Nº 69.727.931/0001-92	CONTRATO Nº	**2022101101**
RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, Nº 38 - CENTRO - ALTO SANTO/CE.	TOMADA DE PREÇOS	**001/2022-TP-CMAS**
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**20/12/2022 Á 27/03/2023**
LOCAL DOS SERVIÇOS: ALTO SANTO/CE.	NUMERO DO DIÁRIO	**180,00**
CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93	DATA:	**09/04/2023**
ART Nº: CE20221075942	DIA DA SEMANA:	**DOMINDO**
	SALDO DE DIAS:	**60,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PARALIZAÇÃO DE OBRA

INTERRUPÇÃO/PARALIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES/FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratado(a)	Assinatura Fiscalização/Supervisão
	VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA SAMUEL BRUNO SOUSA DE FREITAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 061863573-4
